



G CONSELLERIA
O EDUCACIÓ
I I FORMACIÓ
B PROFESSIONAL
/ DIRECCIÓ GENERAL
PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES



SUBCOMISSIÓ DE SEGUIMENT PLA INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES

Documentació relativa al punt 35 de l'Acord Marc de febrer de 2023

1. Rendició de comptes del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023
2. Situació de les ràtios en centres públics en relació amb el punt 13 de l'Acord Marc de febrer de 2023
3. Pla d'Infraestructures Educatives 2023-2027 i 2027-2031


1. Rendició de comptes del Pla de Infraestructures 2026-2023

Actuacions realitzades des de gener de 2016 fins a març de 2023:

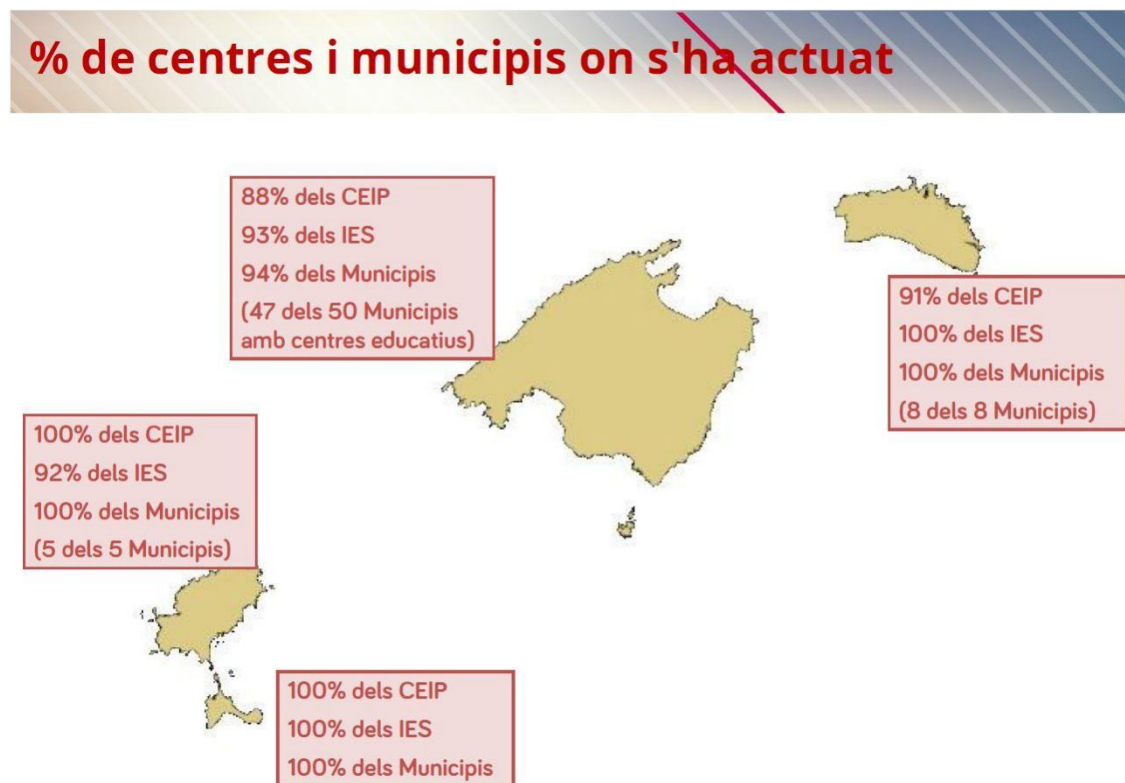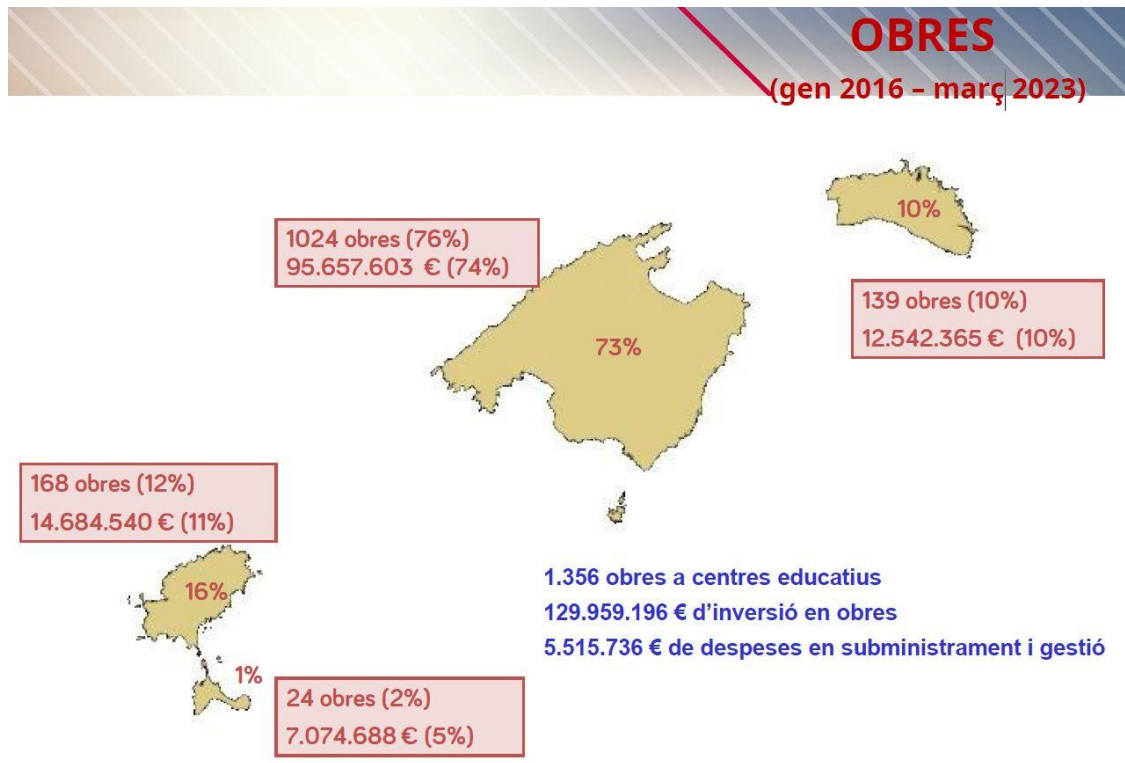

Resum des de gener de 2016 fins març de 2023:

RESUM PER CATEGORIES (Gener 2016 a març 2023)			
CATEGORIA	SUBCATEGORIA	ACTUACIONS	IMPORT
NOUS CENTRES	NOUS CENTRES	13	49.944.651 €
AMPLIACIÓ	AMPLIACIÓ	47	34.869.541 €
MEDI AMBIENT/ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	CALEFACCIÓ / CLIMATITZACIÓ	142	2.452.373 €
	COBERTA	225	8.195.144 €
	FINESTRES I FUSTERIES	99	7.344.449 €
	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	276	1.573.548 €
REFORMA	REFORMA	298	11.957.367 €
ACCESSIBILITAT	BARRERES	100	8.068.250 €
BANYS	BANYS	58	3.855.608 €
GESTIÓ	GESTIÓ/REDACCIÓ	602	3.386.369 €
SUBMINISTRAMENT	SUBMINISTRAMENT/AULES MODULARS	217	2.843.051 €
FIBROCIMENT	FIBROCIMENT	16	984.581 €
TOTAL		2093	135.474.932 €

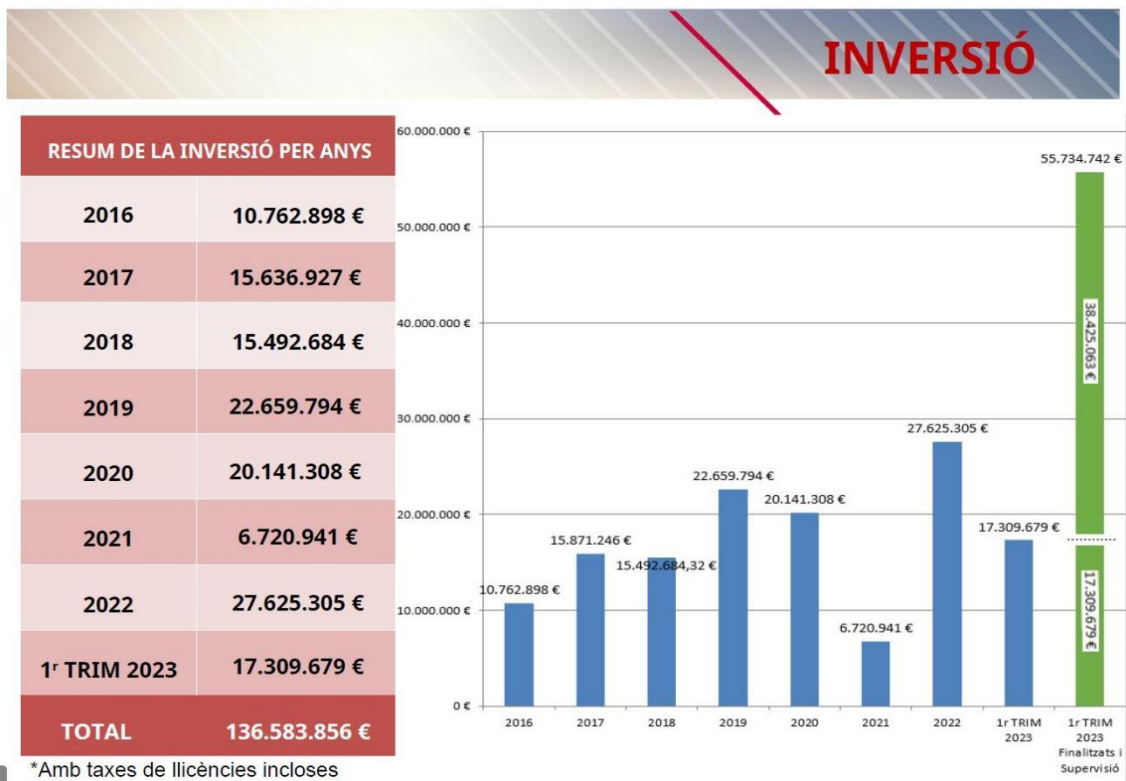

Nous centres i principals obres d'ampliació per illes, executats, en execució o en licitació:

MALLORCA				
NOUS CENTRES I AMPLIACIONS				
1	NOU CEIP PALMA B	NOU CEIP		En licitació
2	NOU CEIP CAMPOS	NOU CEIP		En execució
3	NOU CEIP INCA	NOU CEIP		En execució
4	NOU CEIP ALCÚDIA	NOU CEIP		RECEPCIONAT
5	IES SANTA MARIA	NOU IES		RECEPCIONAT
6	CEIP BLAI BONET	AMPLIACIÓ		En execució
7	CEPA CALVIÀ	NOU CEPA		RECEPCIONAT
8	CEIP MESTRE PERE GARAU	NOU CEIP		RECEPCIONAT
9	IES BINISSALEM	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
10	IES CTEIB	NOU IES		RECEPCIONAT
11	CEIP CLIMENT SERRA	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
12	CEIP ROSA DELS VENTS	AMPLIACIÓ		En licitació
13	IES BERENGUER D'ANOIA	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
14	IES PAU CASESNOVES	AMPLIACIÓ		En execució
15	CEIP SA TORRE	AMPLIACIÓ I REFORMA		RECEPCIONAT
16	CEIP SIMÓ BALLESTER	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
17	CEIP PUNTA DE N'AMER	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
18	CEIP SES CASES NOVES	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
19	CEIP MONTAURA	AMPLIACIÓ		En execució
20	CEIP FORNALUTX	NOU CEIP		En execució
21	CEIP ELIONOR BOSCH	AMPLIACIÓ I REFORMA		En licitació
22	IES PUIG DE SA FONT	AMPLIACIÓ I BARRERES		RECEPCIONAT
23	CEI CAN CIRERA PRIM	NOU CENTRE MODULAR (I)		RECEPCIONAT
24	CEIP SES COMES	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
25	CEIP XALOC	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		En licitació
26	IES PORTO CRISTO	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
27	CONSERVATORI PALMA	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
28	CEIP NA PENYAL	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		En execució
29	CEIP GUILLEM BALLESTER	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
30	CEIP PONENT	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
31	CEIP LLEVANT	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		RECEPCIONAT
32	CEIP NOVA CABANA	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		RECEPCIONAT
33	CEIP SES SALINES	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		RECEPCIONAT
34	CEI CAN CIRERA PRIM	NOU CENTRE MODULAR (II)		RECEPCIONAT
35	IES PORT D'ALCÚDIA	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
36	CEIP NADAL CAMPANER	AMPLIACIÓ		En execució

MENORCA

NOUS CENTRES I AMPLIACIONS A MENORCA

1	CONSERVATORI DE MENORCA (1ª fase)	NOU CENTRE	8.306.388 €	En licitació
2	CEPA JOAN MIR I MIR	NOU CEPA	2.957.142 €	En execució
3	IES JOAN RAMIS I RAMIS	AMPLIACIÓ	2.379.503 €	RECEPCIONAT
4	CEIP PINTOR TORRENT	AMPLIACIÓ	907.835 €	RECEPCIONAT
5	IES JOSEP MIQUEL I GUÀRDIA	AMPLIACIÓ	408.033 €	RECEPCIONAT
6	CEIP ANTONI JOAN ALEMANY	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS	498.988 €	En execució
7	IES CAP DE LLEVANT	AMPLIACIÓ	341.370 €	RECEPCIONAT
TOTAL NOUS I AMPLIACIONS MENORCA			15.799.259 €	

EIVISSA

NOUS CENTRES I AMPLIACIONS A EIVISSA

1	CEIP SES PLANES	NOU CEIP		RECEPCIONAT
2	IES ISIDOR MACABICH	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
3	CEIP SANT CARLES	AMPLIACIÓ		RECEPCIONAT
4	CEIP PUIG DE'N VALLS	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS		RECEPCIONAT

FORMENTERA

NOUS CENTRES I AMPLIACIONS

1	NOU CEIP SANT FERRAN	NOU CEIP		RECEPCIONAT
---	----------------------	----------	--	-------------

* A més, abans de final de maig està previst licitar les obres de construcció dels nous CEIP de Can Picafort i de Caimari i el mes de juliol el nou CEIP Es Mercadal, el CIFP de Ciutadella i el nou IES Maioris.

El Pla d'Infraestructures 2016-2023 preveia la construcció de 23 nous centres i l'ampliació d'altres 10 amb una inversió global de 170 milions d'€.

La previsió a final de 2023 és arribar als 20 nous centres en execució o en licitació amb un increment molt significatiu de les ampliacions per sobre de les inicialment previstes (33 ampliacions majors i 14 de menors, enlloc de les 10 previstes) i una inversió que arribarà als 170 milions d'€ a final d'aquest any.

Pel que fa a la situació dels nous centres i ampliacions previstos al Pla d'Infraestructures 2016-2023, tenint en compte que hi ha hagut un increment molt significatiu de les obres d'ampliació i reforma i alguns projectes de nous centres inicialment no contemplats (nou Conservatori de Menorca o nou CEIP de Felanitx, entre d'altres), és la següent:

Actuació	Situació	Observacions
Nou CEIP Son Macià	Recepcionat	
Nou IES Santa Maria	Recepcionat	
Nou CEIP Alcúdia	Recepcionat	
Nou CEIP Sant Josep	Recepcionat	
Nou CEIP Sant Ferran	Recepcionat	
Nou CEPA Maó	Recepcionat	
Ampliació CEIP Simó Ballester	Recepcionada	
Ampliació IES Binissalem	Recepcionada	
Ampliació IES Puig de Sa Font	Recepcionada	
Ampliació IES Joan Ramis i Ramis	Recepcionada	
Ampliació IES Isidor Macabich	Recepcionada	
Ampliació Conservatori Mallorca	Recepcionada	
Ampliació CEIP Sant Carles	Recepcionada 1ª fase	
Ampliació CEIP Climent Serra	Recepcionada	
Ampliació CEIP Ses Comes	Recepcionada	
Nou CEIP Campos	En execució	
Nou CEIP Inca	En execució	
Nou CEIP Palma B	En execució	
Ampliació CEIP Blai Bonet	En execució	
Nou CEIP Can Picafort	En licitació	
Nou CEIP Caimari	En licitació	
Nou CEIP Es Mercadal	Preparant licitació obres	
Nou IES Maioris	Preparant licitació obres	
Ampliació IES Marc Ferrer	Preparant licitació obres	
Ampliació CEIP Sant Miquel	Preparant licitació obres	
Nou CEIP Santa Eulària	En redacció projecte	
Nou CEIP Sa Pobla	En redacció projecte	
Nou IES Eivissa	En redacció projecte	
Nou IES Son Ferriol	En redacció projecte	Retard disponibilitat solar
Ampliació IES Quartó del Rei	En redacció projecte	
Nou CEIP Bunyola	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Nou CEIP Eivissa	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Nou CEIP Sant Jordi	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Nou CEIP Urbanitzacions	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Nou CEIP Els Caülls	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Nou CEIP Sant Antoni	No iniciat	Pendent disponibilitat solar
Ampliació IES Porreres	No iniciat	Pendent disponibilitat solar

La informació completa del Pla d'Infraestructures 2016-2023 està disponible a:
<https://intranet.caib.es/sites/M170905100932629/>

Projectes de nous centres o ampliacions del període 2016-2023, no previstos inicialment en el Pla d'Infraestructures, actualment en redacció o preparant la licitació de les obres (*):


Actuació	Situació	Observacions
Conservatori de Menorca	Finalitzat	En licitació obres
Ampliació 4 aules IES Damià Huguet	Finalitzat	Pendent llicència obres
Nou CEIP Felanitx	En redacció	
Ampliació CEIP Ses Rotes Velles (gimnàs)	En redacció	
Ampliació CEIP Els Molins	En redacció	
Nou CIP Ciutadella	En redacció	
Ampliació CEIP Pere Cerdà (gimnàs)	En redacció	
Ampliació CEIP Can Misses (gimnàs)	En redacció	
Ampliació CEIP Pare Bartomeu Pou	En redacció	
Ampliació IES La Ribera	En redacció	
Ampliació IES Sant Marçal	En redacció	
Ampliació CEIP Joan Mas i Verd	En redacció	
Ampliació CEIP M ^a de Déu de la Consolació	En redacció	
Ampliació CEIPIESO Pintor Joan Miró	En redacció	

(*) La finalització de la redacció dels projectes inclosos en la taula anterior i la corresponent licitació de les obres està prevista dins l'any 2023.


2- Situació de les ràtios en centres públics en relació amb el punt 13 de l'Acord Marc

Als mapes següents, les zones en groc indiquen, per a cada etapa educativa, els municipis on cal ampliar el nombre de places per poder aplicar la reducció de ràtios del 10% prevista en el punt 13 de l'Acord Marc de febrer de 2023:


Educació Primària:

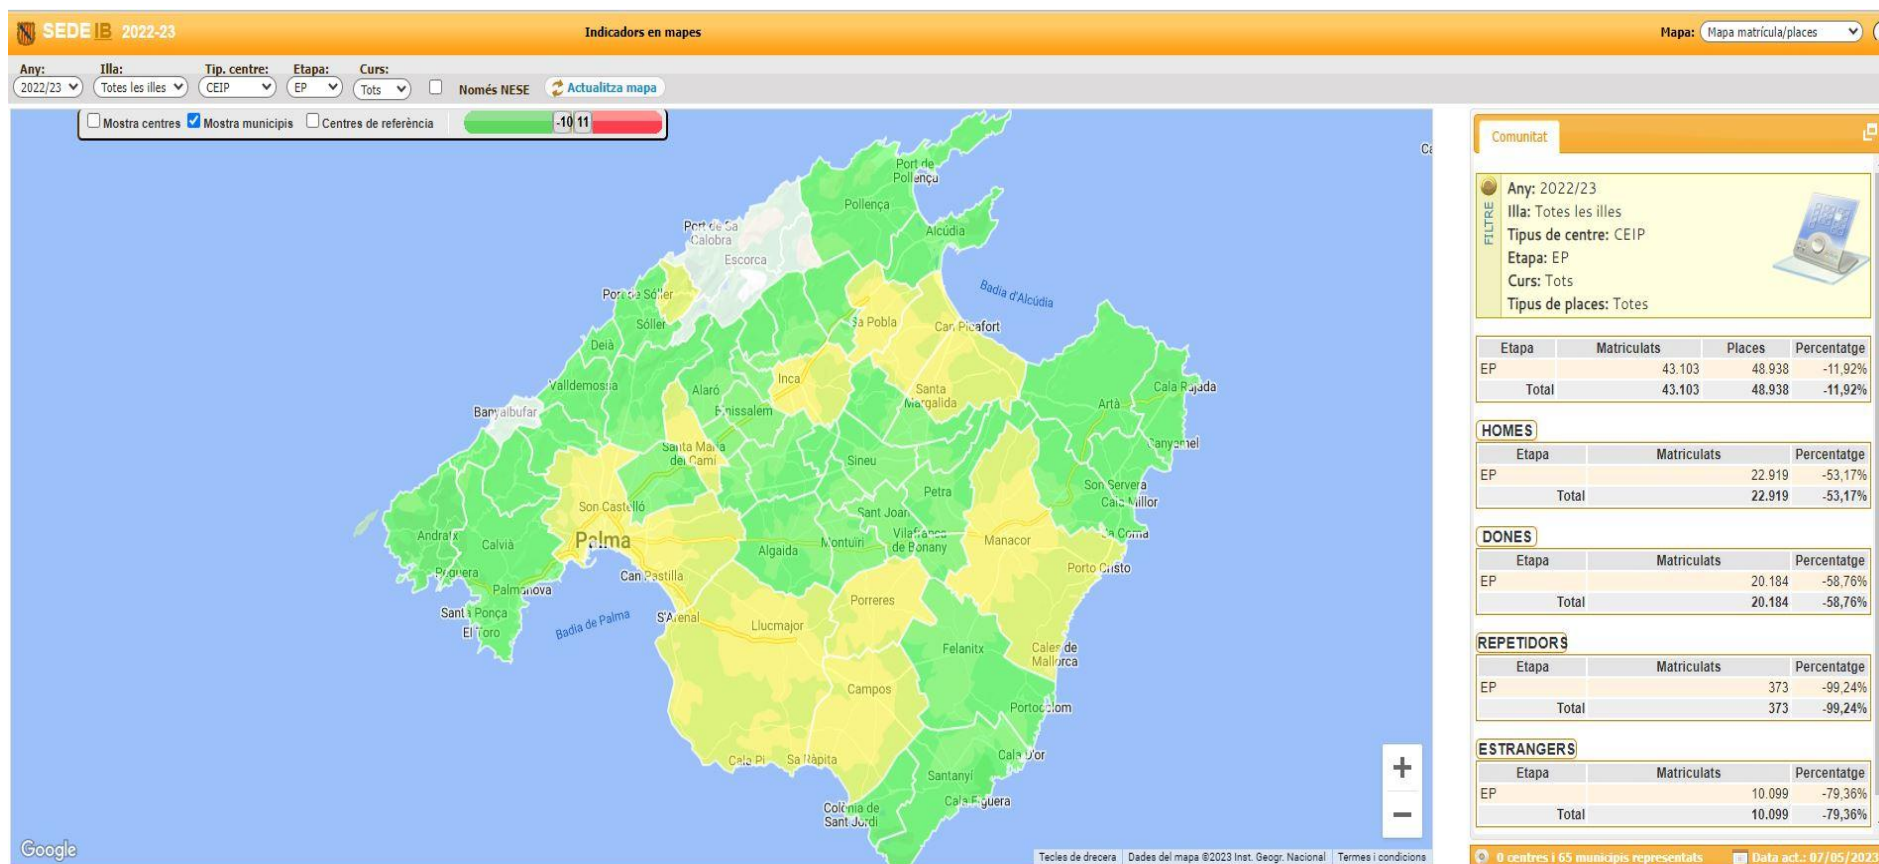


Previstes o en curs ampliacions i/o nous CEIPs als municipis de Palma, Lluçmajor, Campos, Manacor, Santa Maria, Inca, Sa Pobra i Santa Margalida, entre d'altres.

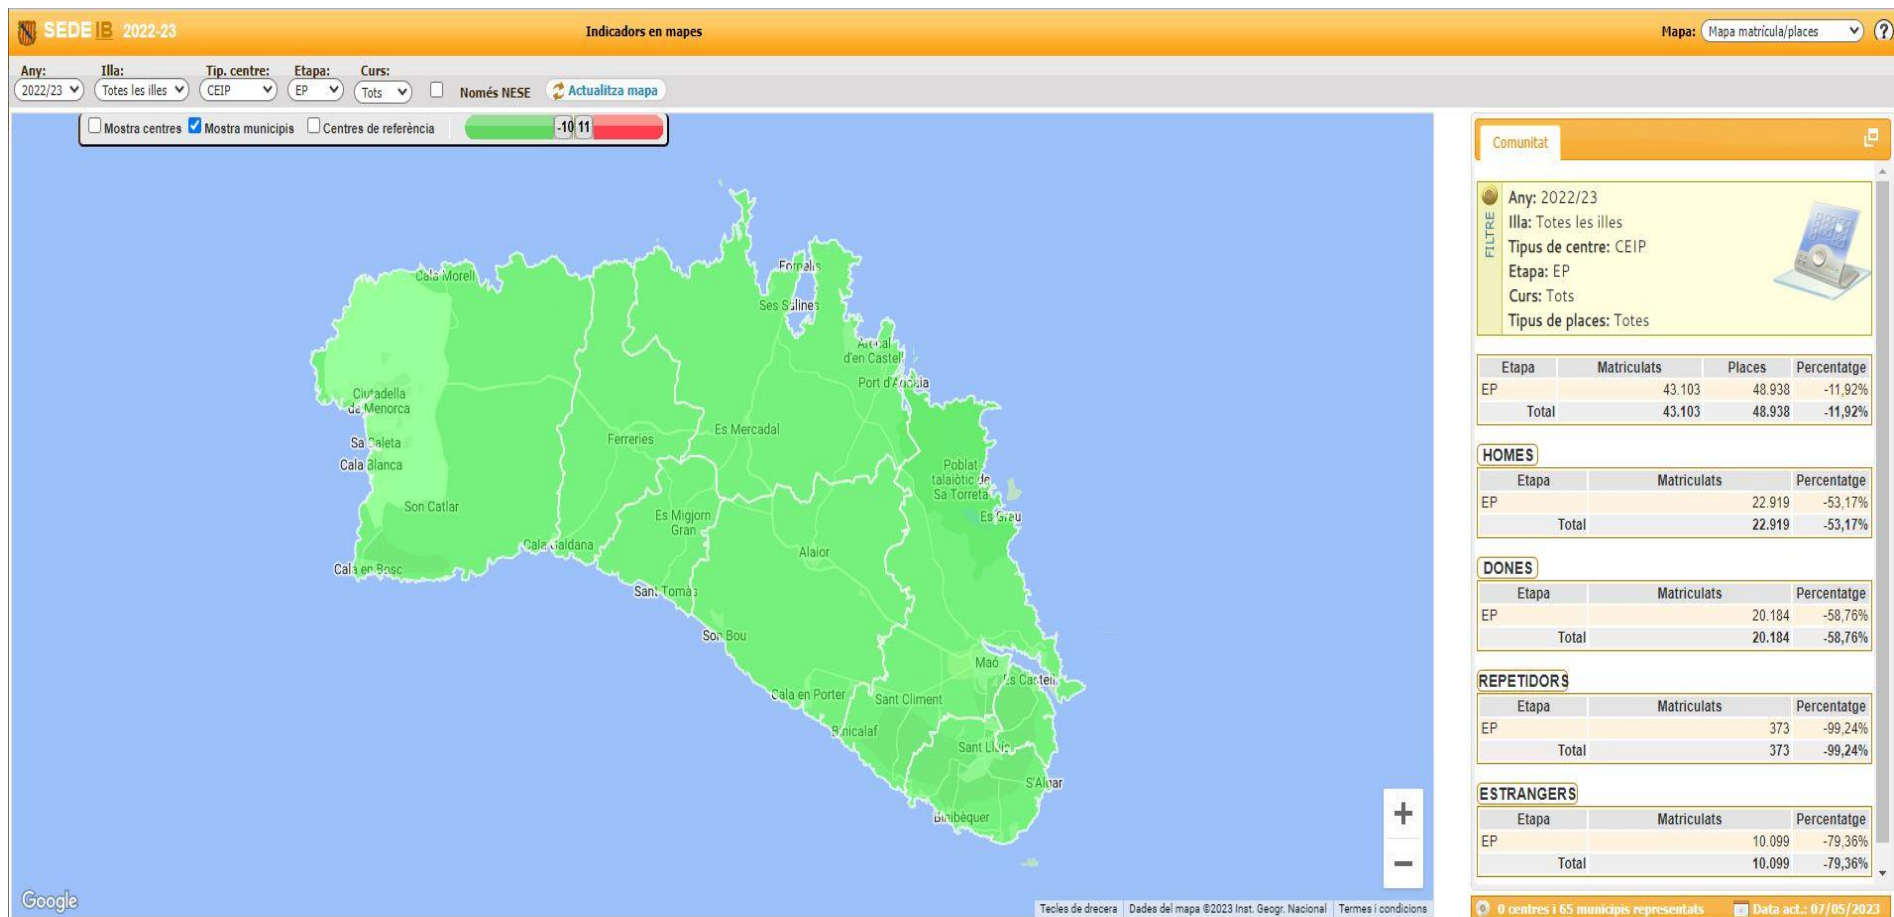

Previst nou CEIP a Es Mercadal.

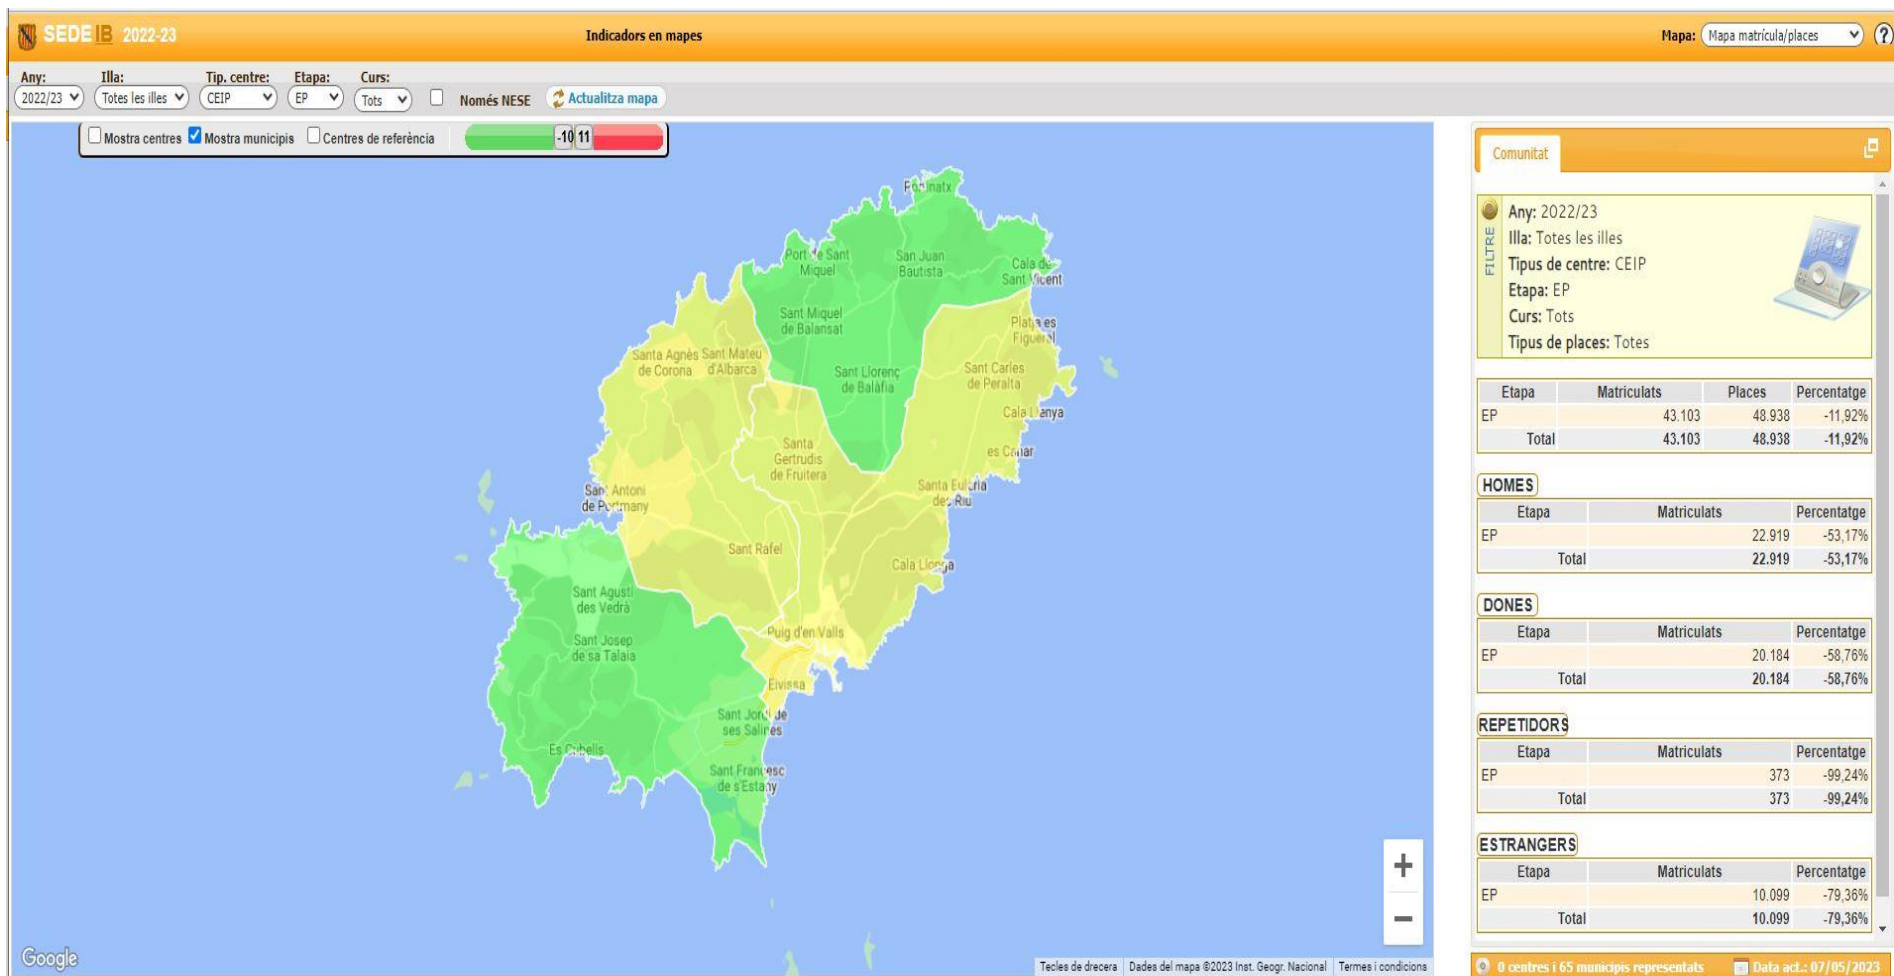


Previstes o en curs ampliacions i/o nous CEIPs als municipis d'Eivissa, Santa Eulària, Sant Josep (Sant Jordi) i Sant Antoni.

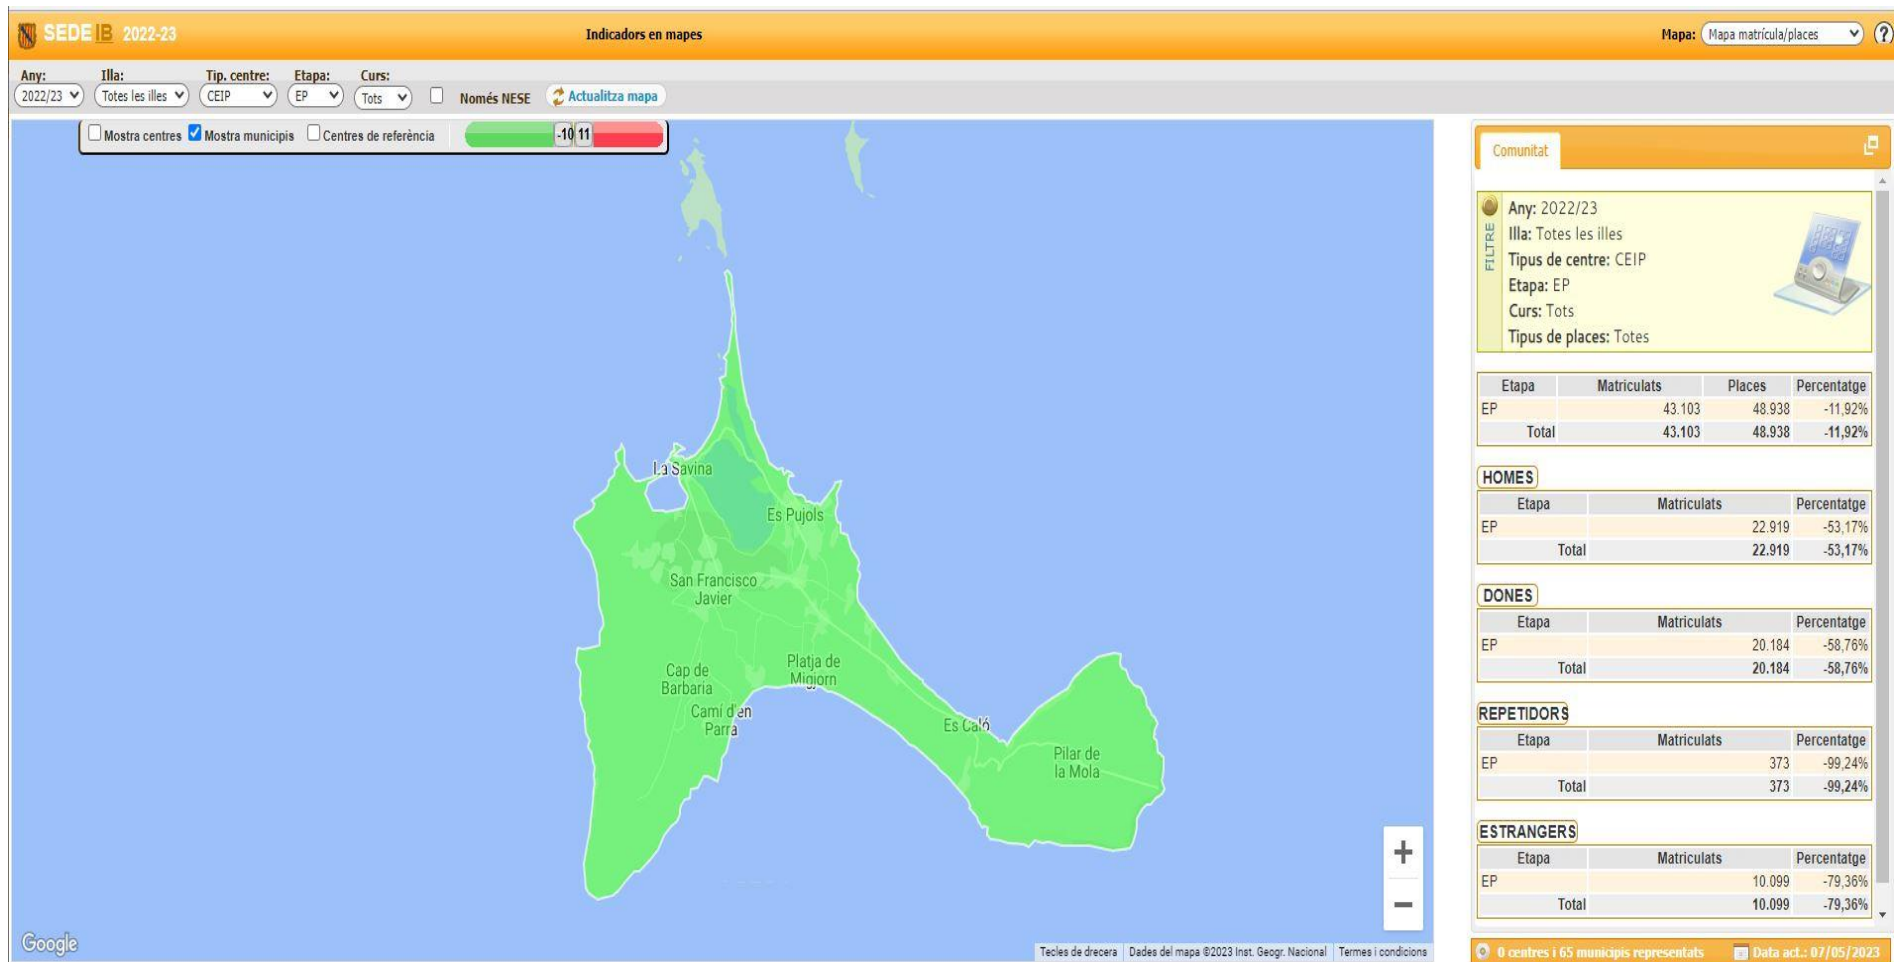


Prevista l'ampliació del CEIP el Pilar.


ESO:

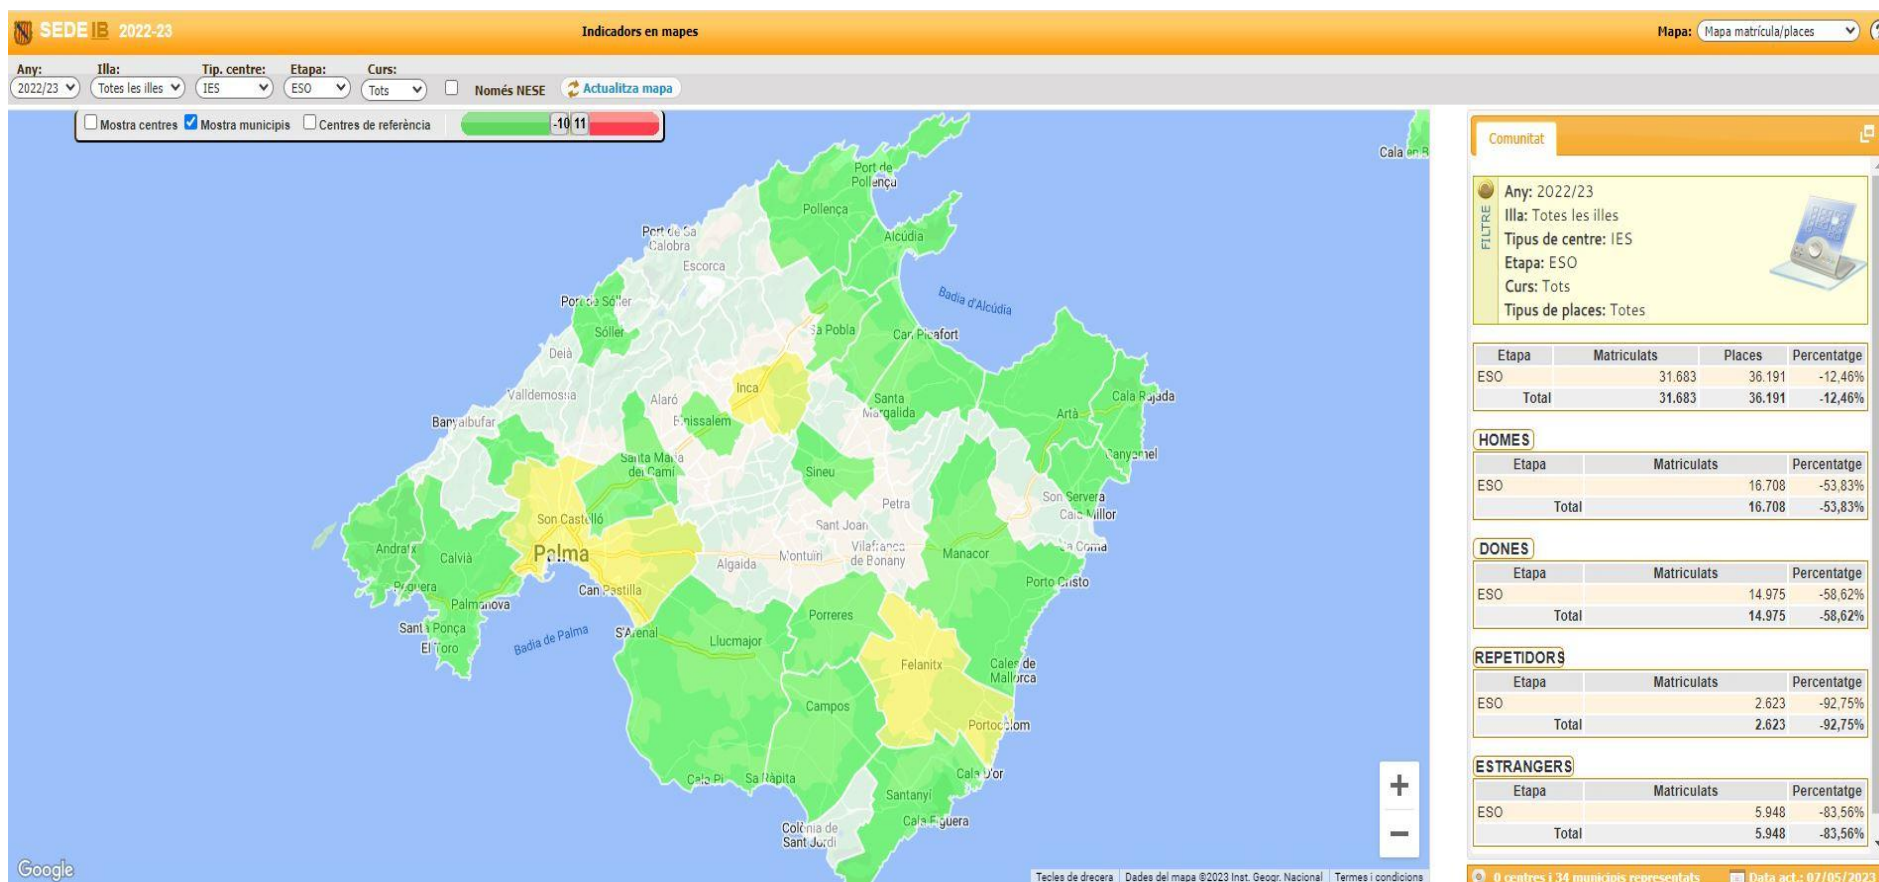


Previstes o en curs ampliacions i/o nous IES als municipis d'Algaida, Artà, Binissalem, Campos, Felanitx, Lluçmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Palma, Porreres, Sa Pobla, Santa Maria i Sineu.

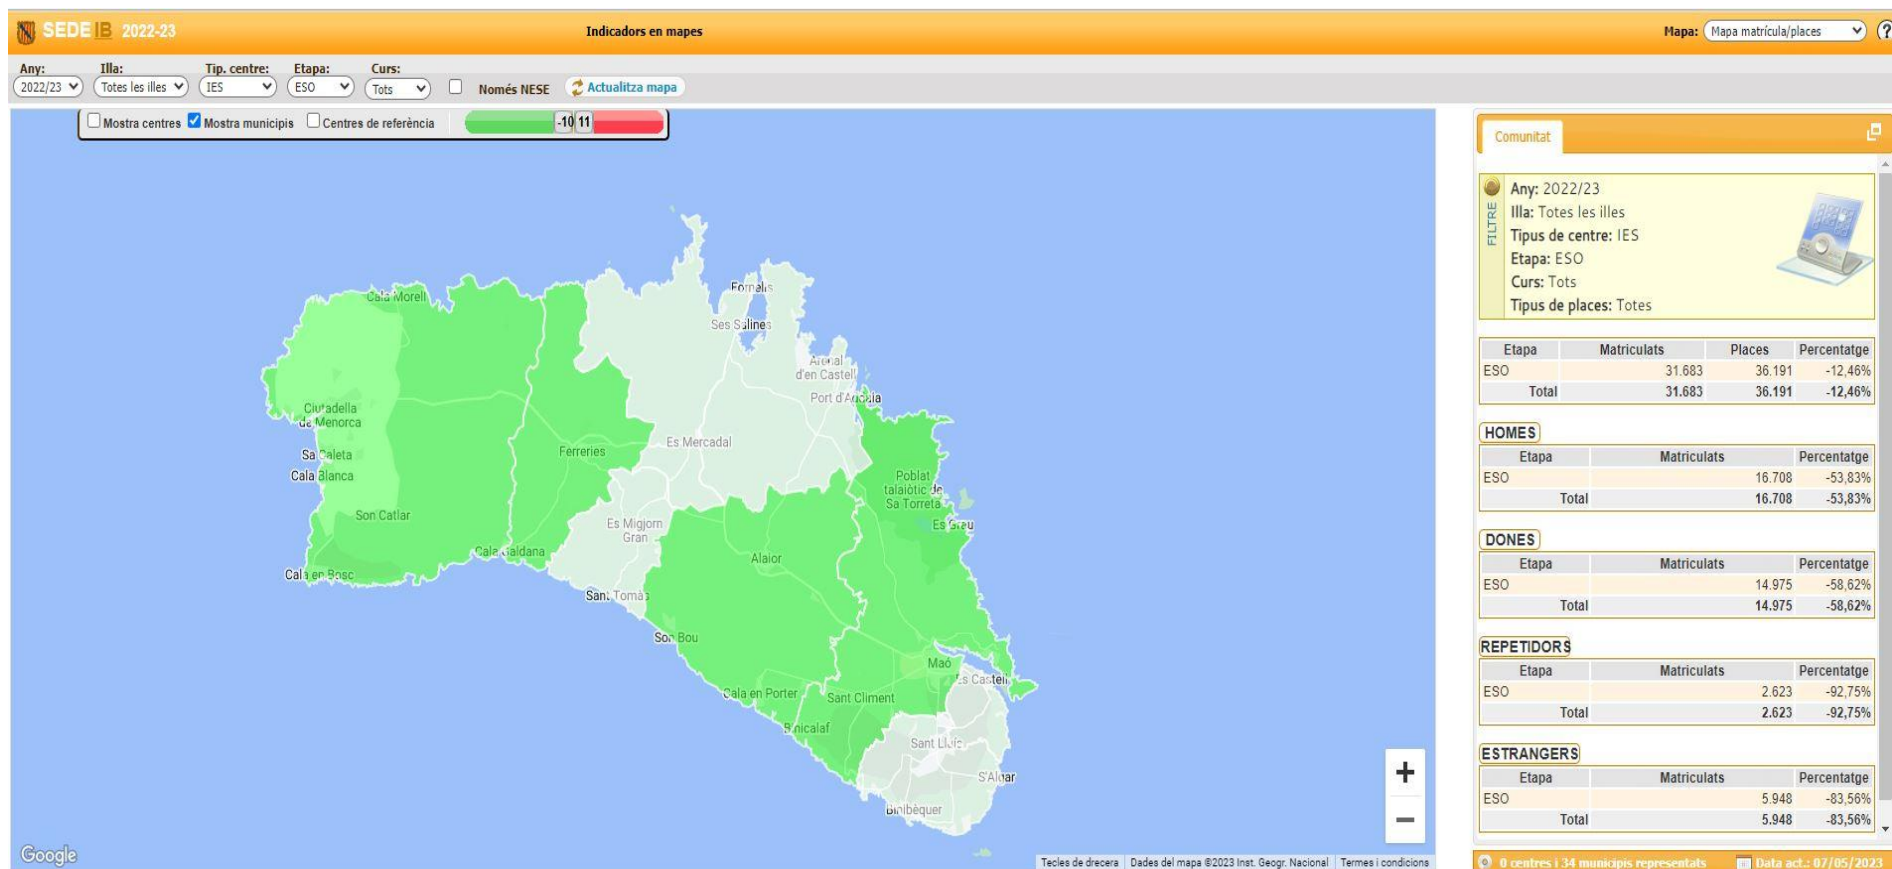

Prevista ampliació IES al municipi de Maó, entre d'altres.

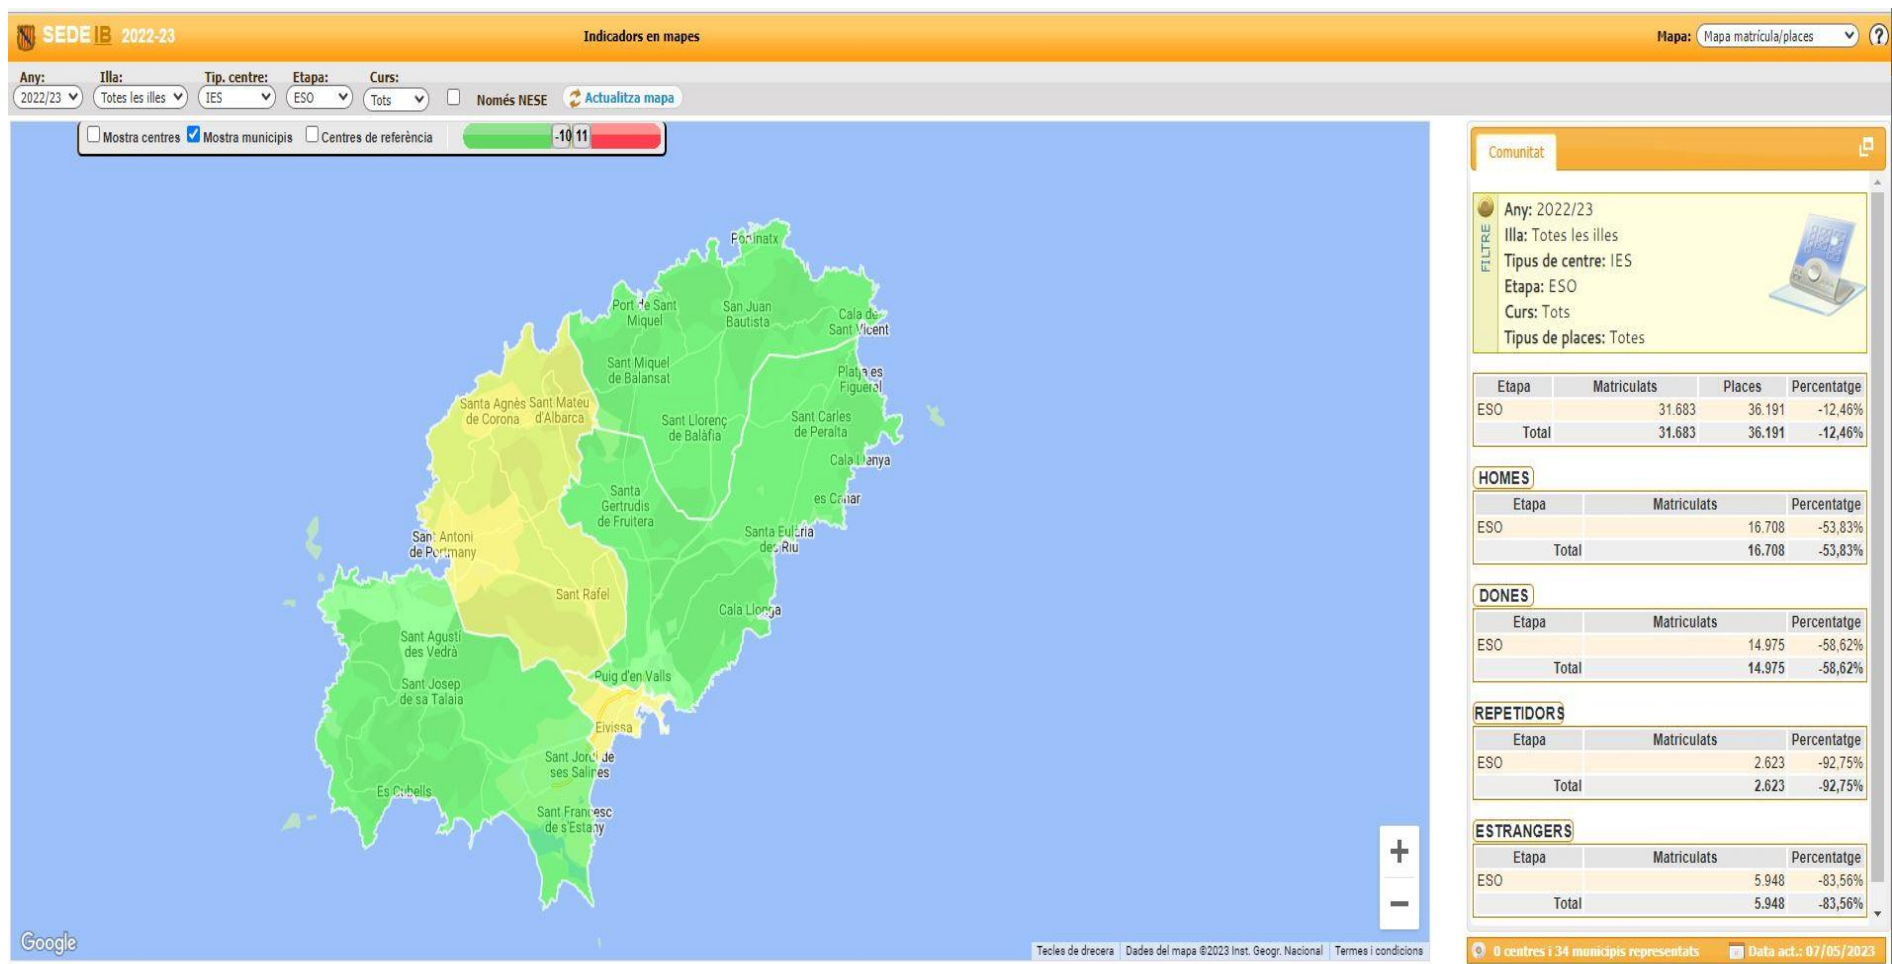


Previstes o en curs ampliacions i/o nous centres als municipis d'Eivissa, Santa Eulària i Sant Antoni.

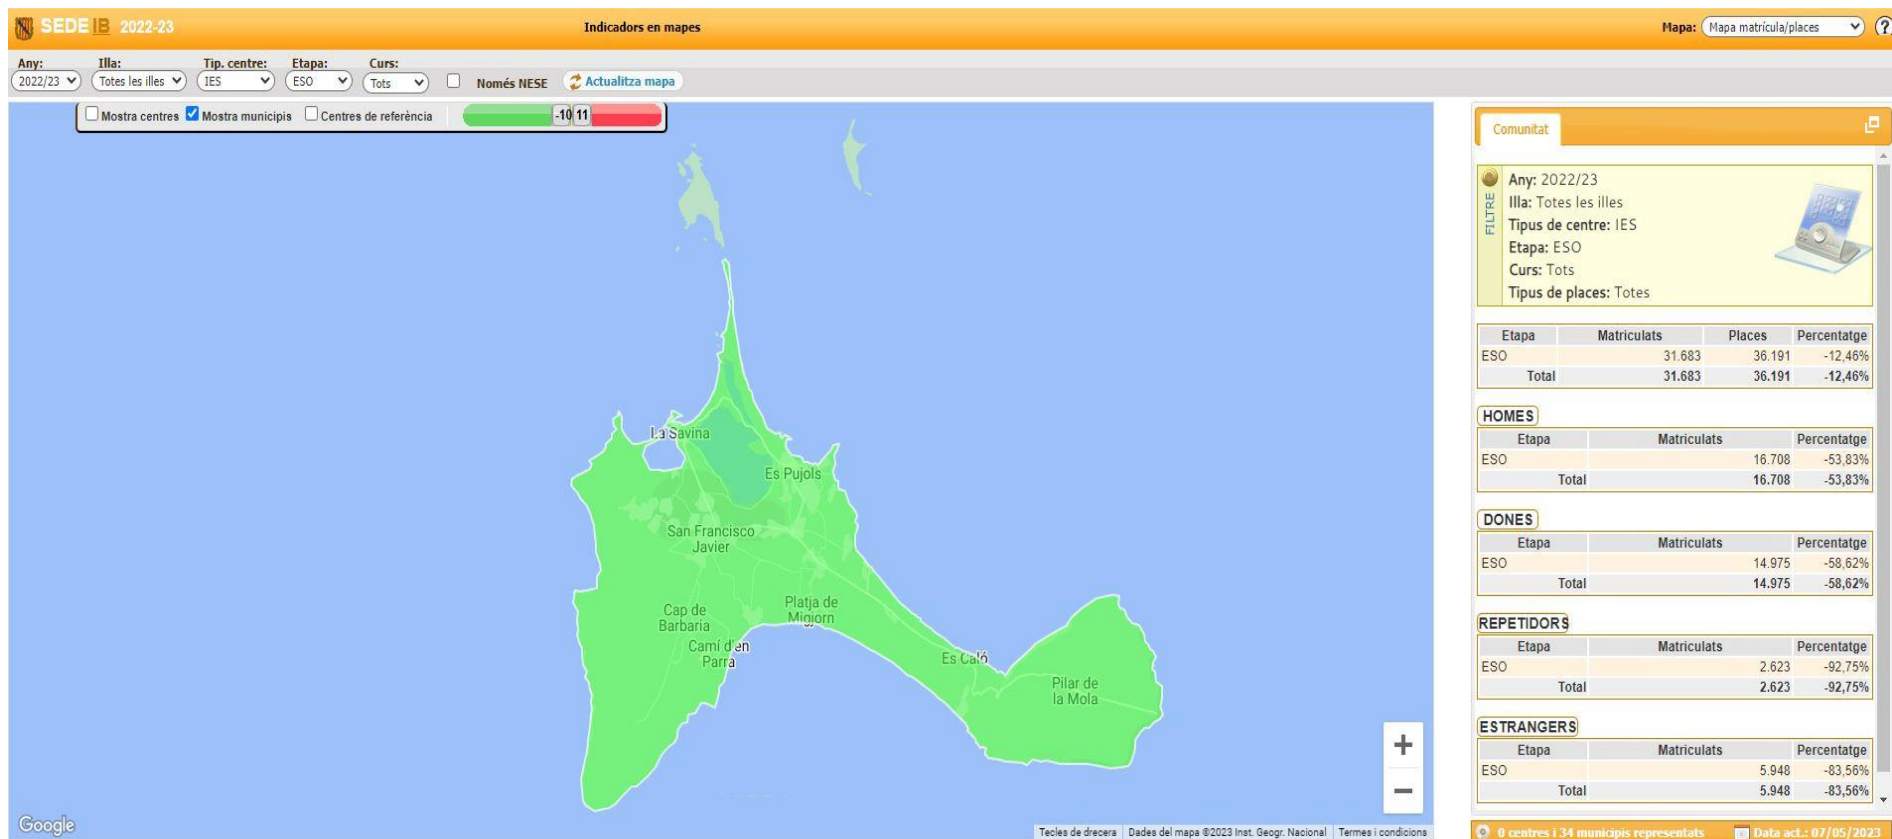


Prevista l'ampliació de l'IES Marc Ferrer.


Batxillerat:

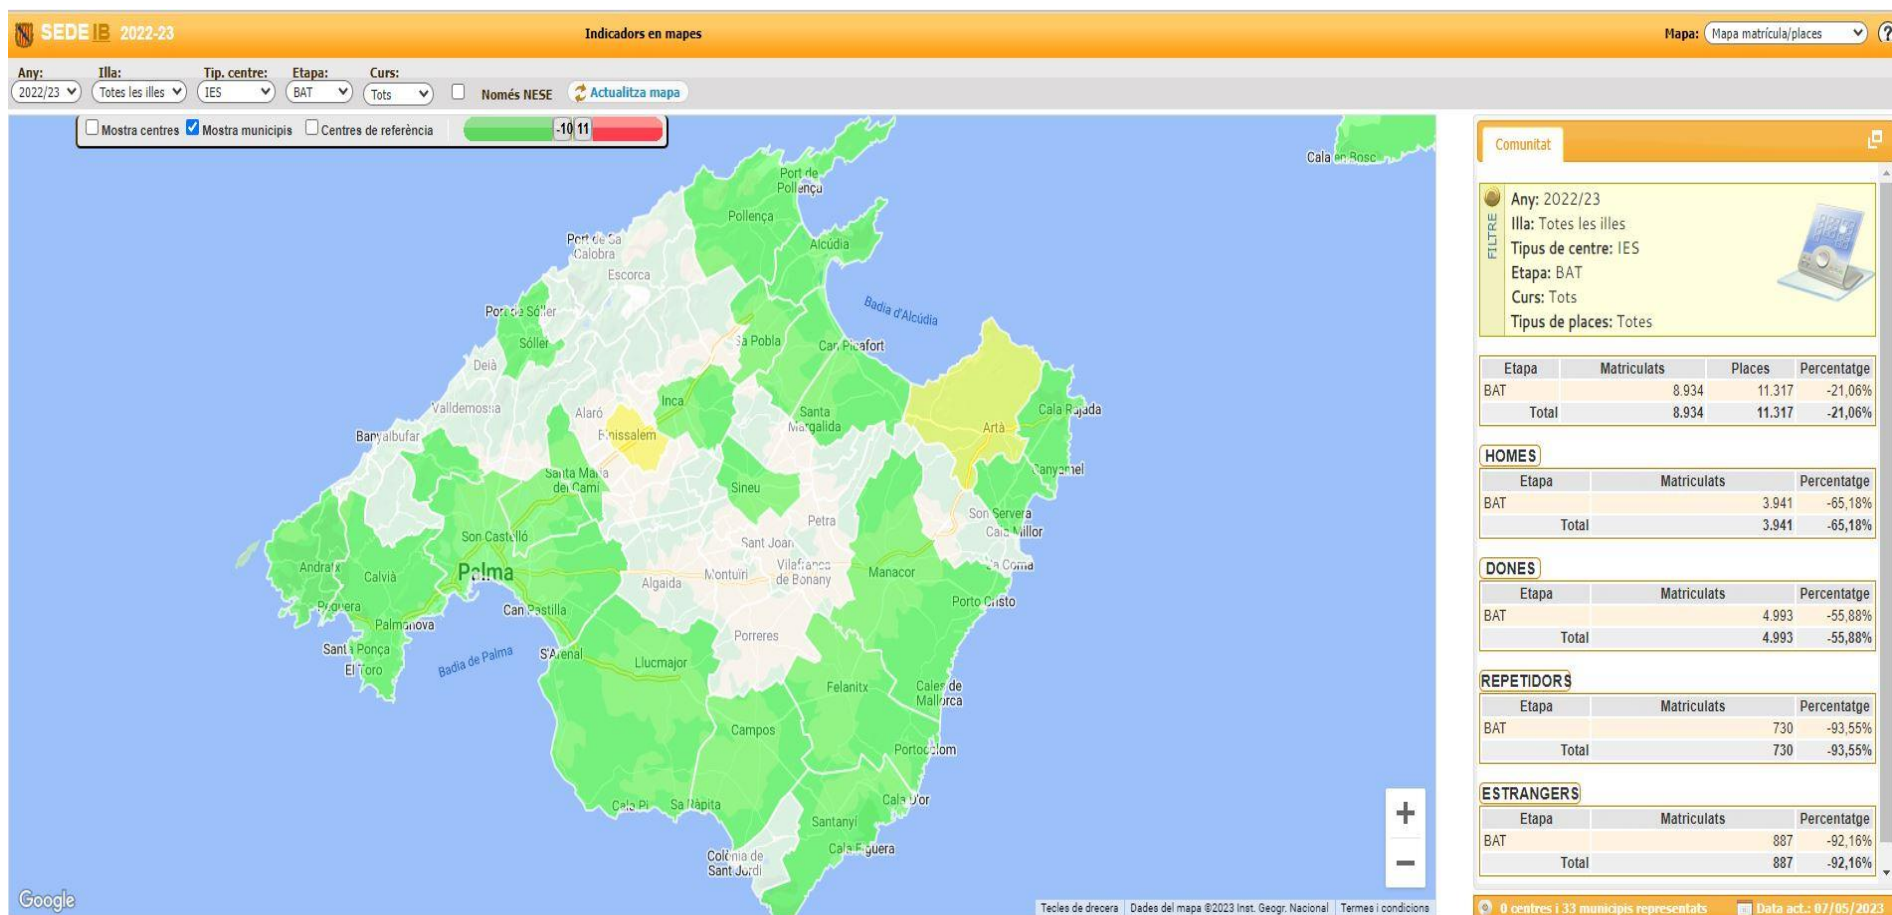


Previstes o en curs ampliacions i/o nous IES als municipis d'Artà, Binissalem, Campos, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Palma, Porreres, Sa Pobla, Santa Maria i Sineu.

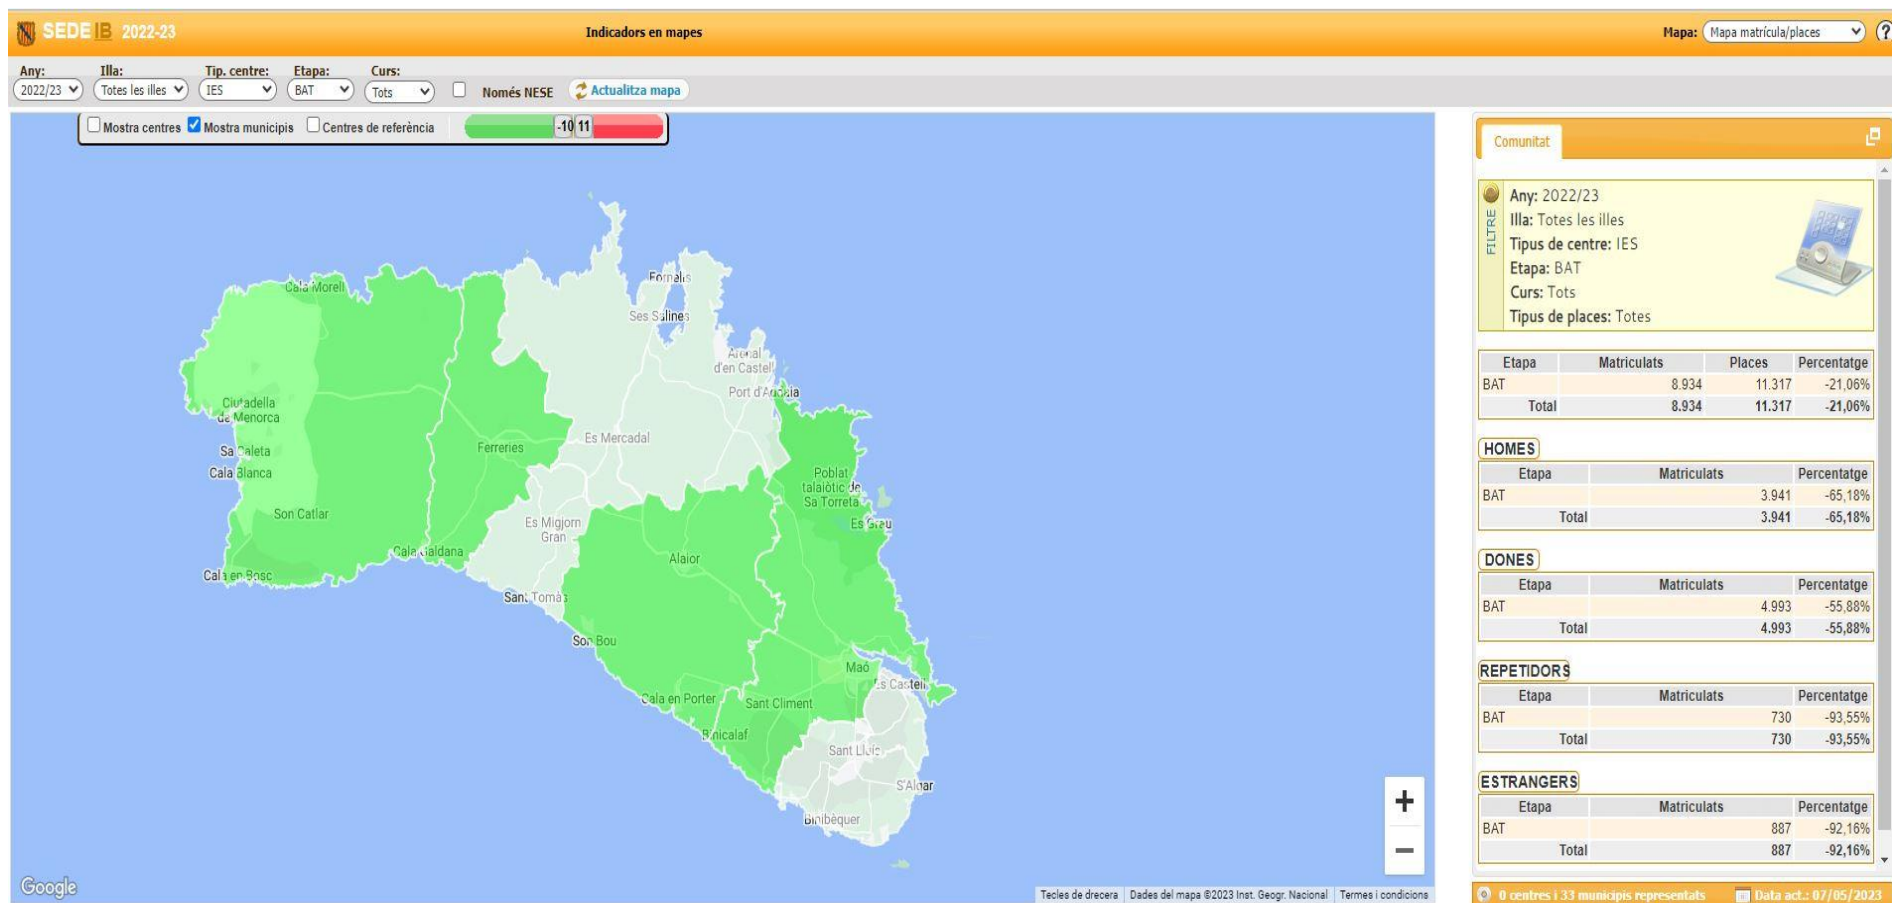

Prevista ampliació IES al municipi de Maó, entre d'altres.

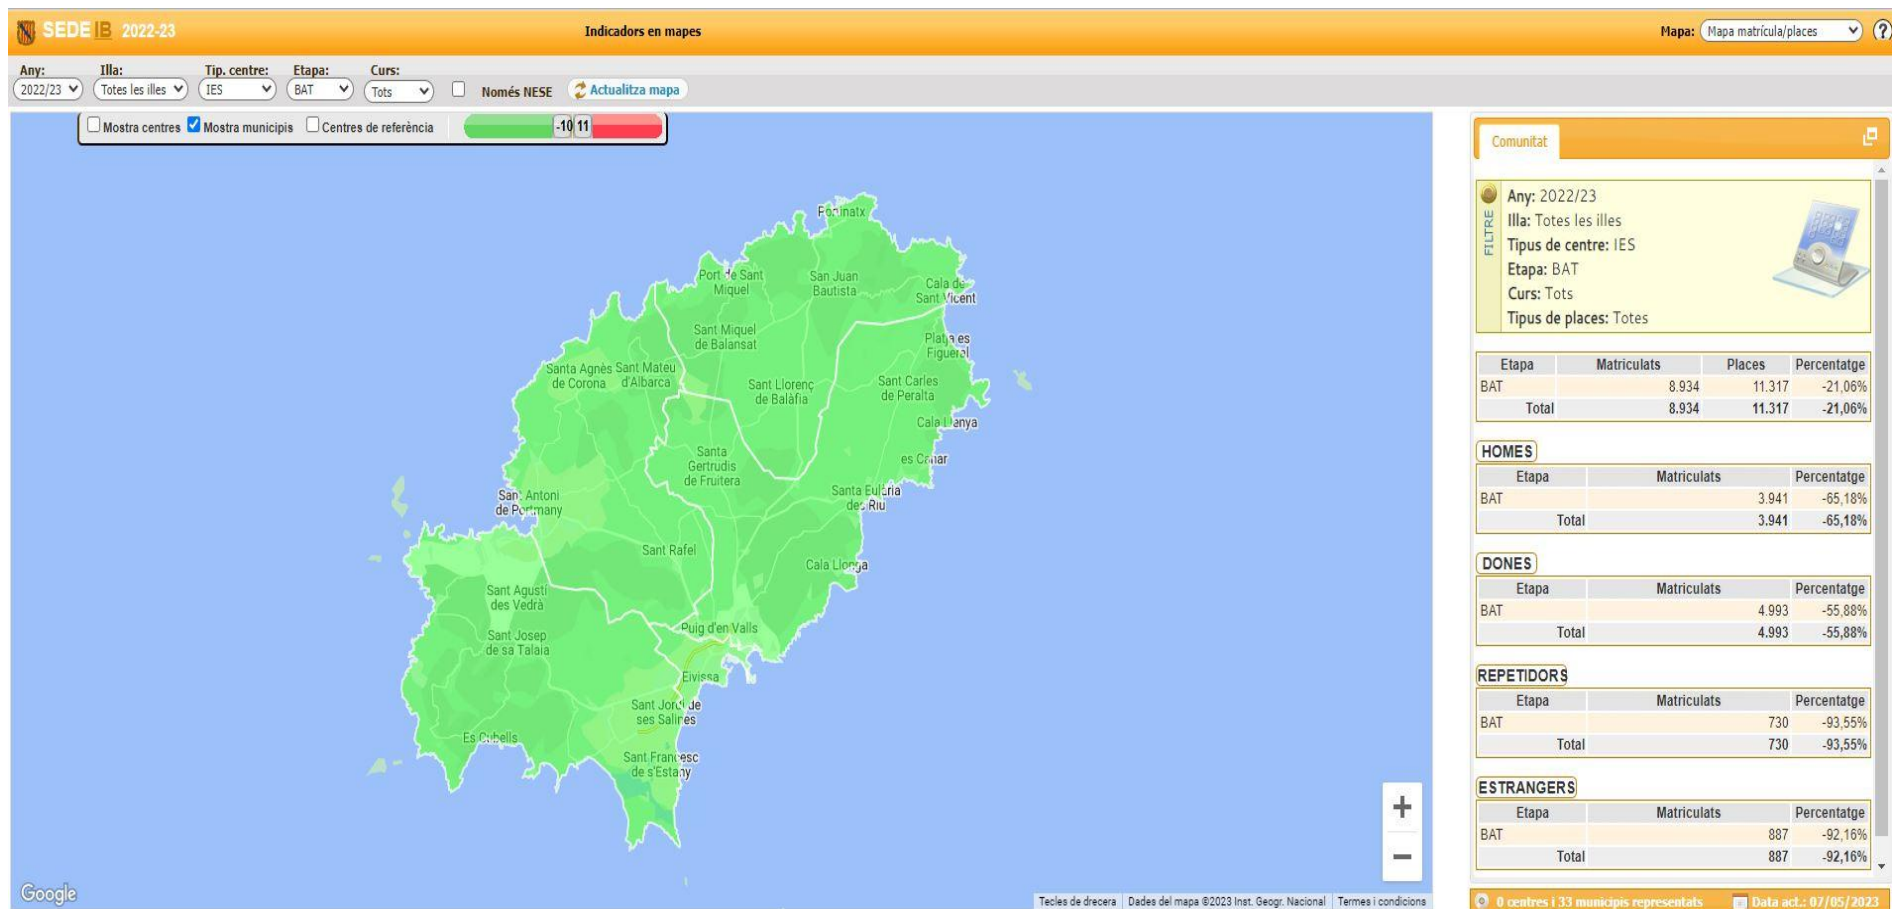

Previstes o en curs ampliacions i/o nous centres als municipis d'Eivissa, Santa Eulària i Sant Antoni.

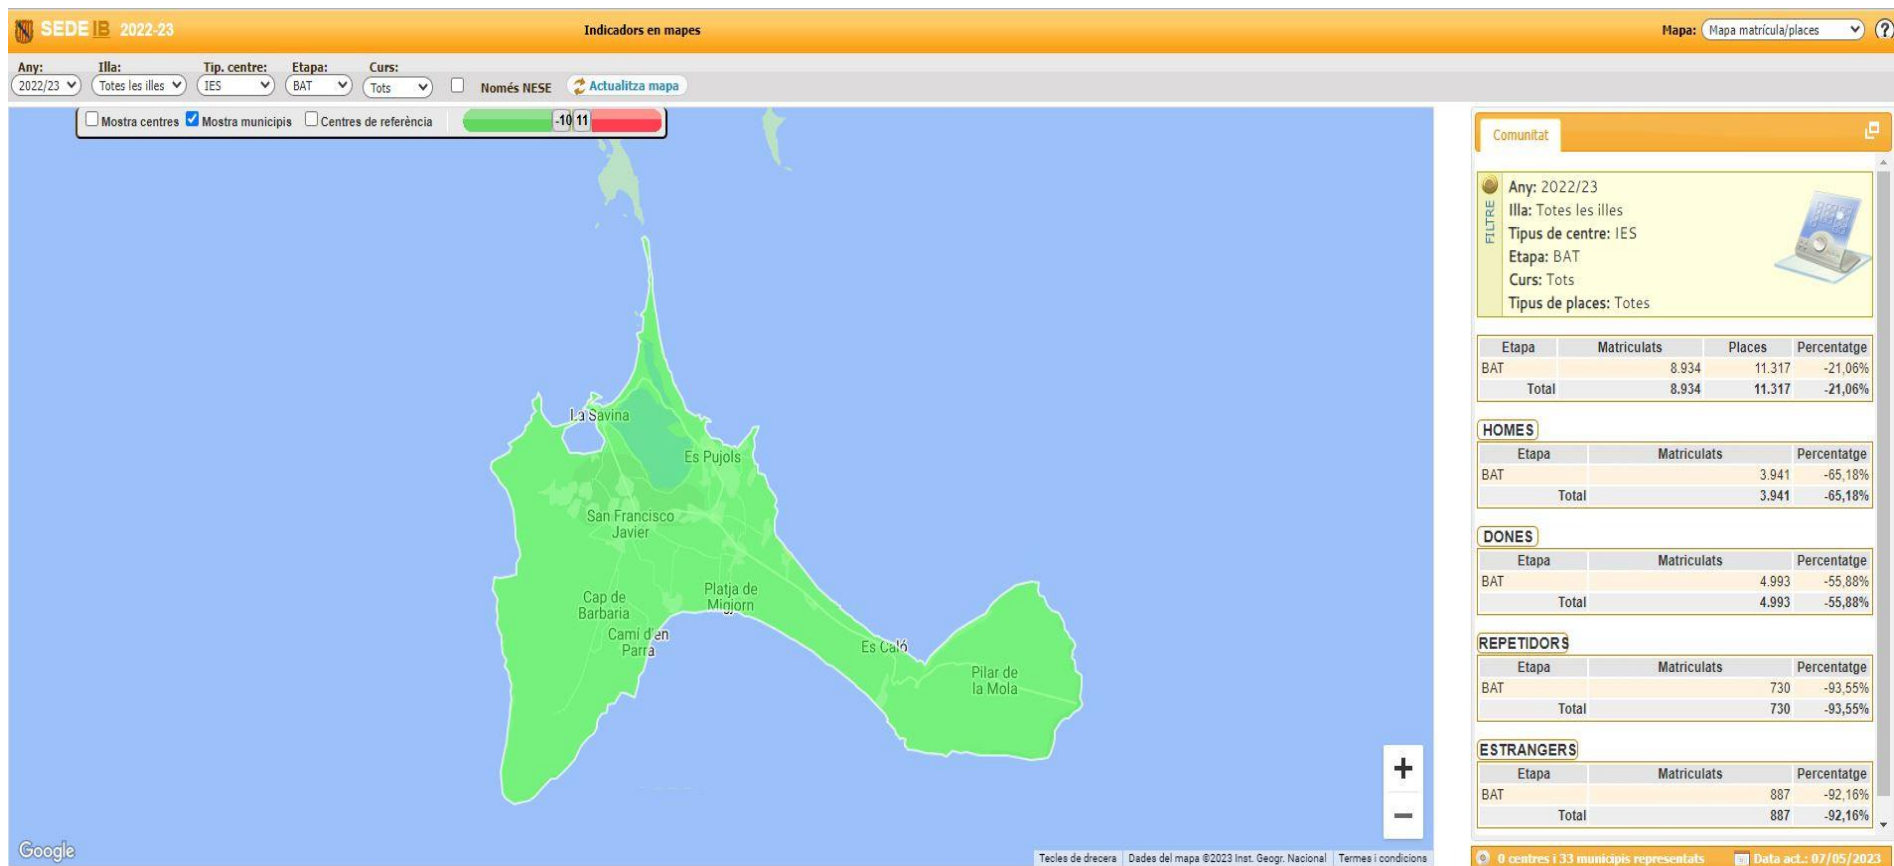

Prevista l'ampliació de l'IES Marc Ferrer.

3. Pla d'Infraestructures Educatives 2023-2027 i 2027-2031

Projectes d'ampliació o de construcció de nous centres actualment en redacció:

PRINCIPALS PROJECTES EN REDACCIÓ A IBISEC O EXTERNALITZATS			
1	IES SES ESTACIONS	Mallorca	AMPLIACIÓ
2	IES QUARTÓ DE PORTMANY	Eivissa	AMPLIACIÓ
3	IES DAMIÀ HUGUET	Mallorca	AMPLIACIÓ 12 aules

Projectes d'ampliació o de construcció de nous centres amb ordre d'inici de redacció:

PROJECTES AMB ORDRE D'INICI DE REDACCIÓ			
4	CEIP SON SERRA	Mallorca	AMPLIACIÓ
5	IES SON PACS	Mallorca	AMPLIACIÓ
6	IES ALBUHAIRA	Mallorca	AMPLIACIÓ
7	IES LLORENÇ GARCIES I FONT	Mallorca	AMPLIACIÓ
8	IES PORRERES	Mallorca	AMPLIACIÓ
9	CEIP SANTA MARIA	Mallorca	NOU CENTRE

Projectes d'ampliació o de construcció de nous centres pendents d'inici de redacció:

PROJECTES AMB INICI DE REDACCIÓ PREVIST A PARTIR DE 2023			
10	CEIP SON BASCA	Mallorca	AMPLIACIÓ
11	IES SINEU	Mallorca	AMPLIACIÓ
12	CEIP SANT JORDI	Eivissa	NOU CENTRE
13	IES PALMA B	Mallorca	NOU CENTRE
14	CEIP NA PENYAL	Mallorca	AMPLIACIÓ ETAPA EI
15	IES MARRATXÍ	Mallorca	NOU CENTRE

16	CEIP ELS CAÜLLS	Mallorca	NOU CENTRE
17	CEIP ANTÒNIA ALZINA	Mallorca	AMPLIACIÓ
18	CEIP BUNYOLA	Mallorca	NOU CENTRE
19	CEIP MANACOR	Mallorca	NOU CEIP
20	CEIP SANT ANTONI	Eivissa	NOU CENTRE O AMPLIACIÓ
21	CEIP ROBINES	Mallorca	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS
22	IES SANTA MARIA	Mallorca	AMPLIACIÓ BATXILLERAT
23	CEIP POETA VILLANGOMEZ	Eivissa	AMPLIACIÓ AMB GIMNÀS
24	CEIP PALMA	Mallorca	NOU CENTRE
25	CEIP EL PILAR	Formentera	AMPLIACIÓ
26	CEIP BÚGER	Mallorca	NOU CEIP
27	IES ALGAIDA	Mallorca	NOU IES ESO
28	CEIP EIVISSA	Eivissa	NOU CEIP
29	CIFP JUNÍPER SERRA	Mallorca	AMPLIACIÓ
30	IES SON CLADERA	Mallorca	NOU IES
31	CEIP DURAN ESTRANY	Mallorca	NOU CEIP
32	IES BINISSALEM	Mallorca	AMPLIACIÓ
33	IES CAP DE LLEVANT	Menorca	AMPLIACIÓ
34	IES FELANITX	Mallorca	AMPLIACIÓ
35	CEIP SANTA ISABEL	Mallorca	AMPLIACIÓ
36	IES JOSEP FONT I TRIAS	Mallorca	AMPLIACIÓ BATXILLERAT
